

**“Thu thập thông tin quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng;
tính toán lũ, ngập lụt và lập phương án vận hành, điều tiết các hồ chứa
nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý”
hồ chứa nước Dầu Tiếng**

BẢN TIN NHANH HỖ TRỢ VẬN HÀNH NGÀY 8/9/2026


1. Diễn biến mực nước và dung tích hồ Dầu Tiếng ngày 8/9/2026

Về hiện trạng dung tích hồ đạt 765,87 triệu m³ chiếm 48,45% tổng dung tích toàn bộ, nhỏ hơn 144,04 triệu m³ so với TBNN (909,91 triệu m³) và nhỏ hơn 142,73 triệu m³ so với năm 2025 (908,6 triệu m³) cùng thời kỳ. Dung tích trống trừ lũ còn lại tính đến ngày 08/09 là 814,93 triệu m³ so với dung tích toàn bộ (1580,8 triệu m³).

Về hiện trạng mực nước hồ đạt +19,73 m thấp hơn 1,06 m so với mực nước hồ năm 2025 (+20,79 m), và thấp hơn 0,92 m so với TBNN là +20,65 m cùng thời kỳ. Mực nước hồ thấp hơn 3,57 m so với mực nước cao nhất trước lũ (+23,3 m) từ ngày 1/9-15/9 hằng năm theo quy định trong QTVH liên hồ và thấp hơn 4,67 m so với MNDBT (24,4 m).

2. Dự báo lượng mưa khu vực lòng hồ hạ lưu hồ Dầu Tiếng từ 8/9 – 14/9/2026

Lượng mưa dự báo trên lưu vực hồ Dầu Tiếng từ ngày 08/09 – 14/09/2026 biến đổi từ 0-30 mm. Mưa lớn nhất xảy ra vào ngày 11/09 với lượng mưa dự báo trên thượng lưu lưu vực Dầu Tiếng biến đổi từ 25-30 mm.

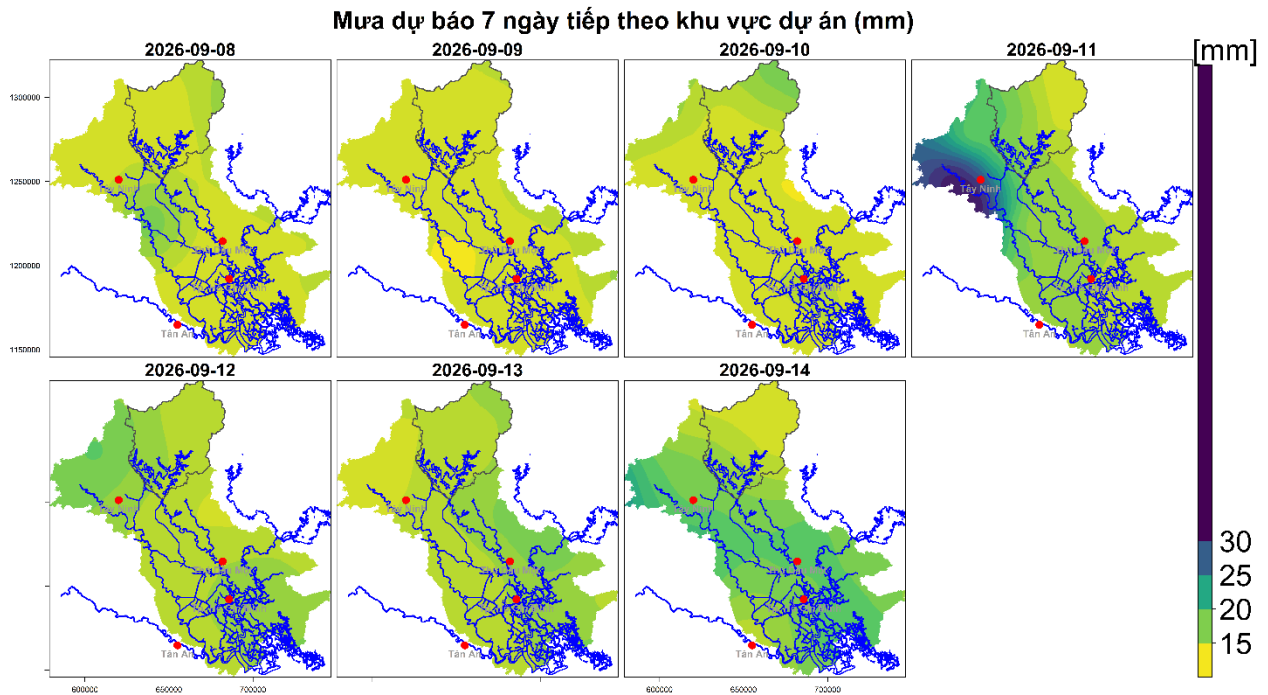

Hình 1. Dự báo mưa 7 ngày tiếp theo trên lưu vực và hạ lưu hồ Dầu Tiếng

3. Dự báo dòng chảy đến và diễn biến đặc trưng hồ từ 8/9 – 14/9/2026

Dự báo dòng chảy đến hồ có xu hướng tăng trong tuần tới, với giá trị dòng chảy trung bình dự báo khoảng 138,5 m³/s và đạt giá trị lớn nhất là 174,11 m³/s vào ngày 11/09. Tổng lượng dòng chảy về hồ ước tính xấp xỉ 83,76 triệu m³ tương đương 11,97 triệu m³/ngày.

Tính toán với điều tiết cấp nước theo kế hoạch và duy trì dòng chảy môi trường 20 m³/s, dự báo mực nước hồ đạt +20,19 m vào ngày 14/09 tương ứng dung tích là 826,08 triệu m³ (chiếm 52,26 % của dung tích toàn bộ).

Bảng 1. Dự báo dòng chảy đến hồ và đặc trưng thủy văn hồ Dầu Tiếng từ 8-14/09

Ngày	Q_đến (m ³ /s)	W_đến (triệu m ³)	W (triệu m ³)	Z_hồ (m)
8/9/2026	111,09	9,60	765,87	+19,73
9/9/2026	88,39	7,64	773,87	+19,79
10/9/2026	109,35	9,45	779,92	+19,84
11/9/2026	174,11	15,04	787,77	+19,90
12/9/2026	165,80	14,32	801,22	+20,00
13/9/2026	158,87	13,73	813,95	+20,10
14/9/2026	161,88	13,99	826,08	+20,19

4. Khuyến nghị

Tiếp tục ưu tiên tích nước trong tháng 9 và theo dõi sát diễn biến mưa, dòng chảy để điều chỉnh vận hành xả đảm bảo dòng chảy môi trường và cấp nước hạ du theo kế hoạch.

Tư vấn sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dòng chảy về hồ trong những ngày tiếp theo để có những khuyến nghị cập nhật.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&MT;
- Cục QL&XD CTTL;
- Lãnh đạo các Sở NN&MT vùng dự án;
- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam;
- Website: www.siwrp.org.vn;
- Lưu TTU'PTT.
